

ИНВЕТОР <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24	Форма по ОКУД	Код			
		по ОКПО	0322001			
	ЗАКАЗЧИК <i>(Генподрядчик)</i> <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалМонтажСтрой» (ООО «УниверсалМонтажСтрой») 443124, Самарская область, г. Самара, 5-я Просека, д. 104, офис 8	по ОКПО	60264627		
	ПОДРЯДЧИК <i>(Субподрядчик)</i> <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	Благоустройство дворовых территорий в муниципальном районе Волжский Самарской области	по ОКПО	13781849		
СТРОЙКА <i>(наименование, адрес)</i>		Вид деятельности по ОКДП				
	Договор подряда (контракт)	номер	5МК-УГ/2018			
		дата	15	05	2018	
		Вид операции				


Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-1	31/05/2018	15/05/2018	31/05/2018

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Затраты и работы, включаемые в стоимость работ				
1	с.п.Рождествено - дворовая территория ж/домов №№ 1,1к,3,5,7,9 ул.Шоссейная	АКТ-1	1 634 423,39	1 634 423,39	1 634 423,39
	Итого		1 634 423,39	1 634 423,39	1 634 423,39
	Сумма НДС		294 196,21	294 196,21	294 196,21
	Всего с учетом НДС		1 928 619,60	1 928 619,60	1 928 619,60

Заказчик: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
(должность) _____ *(подпись)* А.Н.Селезнев
(расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность) _____ *(подпись)* А.Ю. Ксенафонов
(расшифровка подписи)

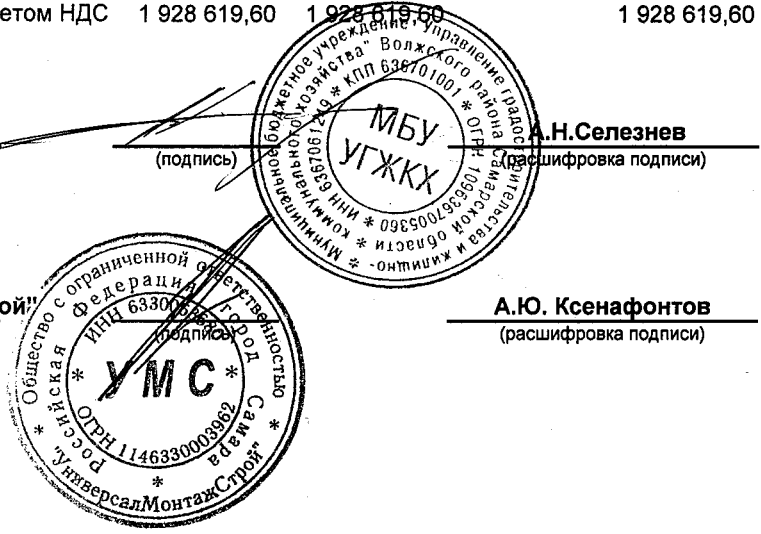

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код		
	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24	по ОКПО	0322005		
Заказчик	(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627		
Подрядчик	(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	13781849		
Стройка	Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области (наименование, адрес)				
Объект	с.п.Рождествено - дворовая территория ж/домов №№ 1,1к,3,5,7,9 ул.Шоссейная (наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП			
	Договор подряда (контракт)	номер	5МК-УГ/2018		
		дата	15	05	2018
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1	31/05/2018	15/05/2018	31/05/2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по-рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пешеходные дорожки, входа в подъезд - 288м2					
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (288м2 x 0,35м = 100,8м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,101	62 555,29	6 318,08
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	5,4227	264,85	1 436,20
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	5,42269	1 165,12	6 318,08
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 4 км, I класс груза	03-21-01-004	1 т груза	176,75	61,59	10 886,03
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (200мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,48	32 323,81	15 515,43
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,5456	157,47	1 188,21
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,6624	251,40	1 674,93
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,0592	738,23	1 520,16
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,8496	2 214,94	1 881,81
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	3,3984	3 061,99	10 405,87
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,3552	1 296,54	460,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода	411-0001	м3	2,4	24,52	58,85
4	4	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	52,8	644,71	34 040,69
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	2,88	7 729,53	22 261,08
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	75,5712	166,09	12 551,62
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	9,1296	216,51	1 976,65
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	3,312	738,23	2 445,02
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	4,2624	1 198,11	5 106,82
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,5552	1 296,54	2 016,38
		Вода	411-0001	м3	5,76	24,52	141,24
6	6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	408-0393	м3	50,112	1 057,14	52 975,40
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	2,88	29 647,15	85 383,73
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	43,5456	182,47	7 945,77
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,144	224,36	32,31
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0576	1 159,93	66,81
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0864	738,23	63,78
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	2,448	460,76	1 127,94
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0576	875,80	50,45
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,1728	18 140,02	3 134,60
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	1,44	644,71	928,38
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	20,5632	3 504,61	72 066,00
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см до толщ. 5см к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4	27-07-001-02	100 м2 покрытия	2,88	18 913,66	54 471,34
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	26,7264	182,47	4 876,77
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,6128	460,76	743,11
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	13,9392	3 504,61	48 851,46
9	9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	2,7	33 601,29	90 723,48
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	205,416	166,09	34 117,54
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,836	264,85	486,26
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	1,836	1 159,93	2 129,63
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,108	875,80	94,59
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0027	53 977,42	145,74
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,459	3 209,20	1 473,02
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	15,93	3 283,45	52 305,36
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,162	2 824,68	457,60
10	10	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-15,93	3 283,45	-52 305,36
11	11	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,162	2 824,68	-457,60
12	12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 к ЗТ = 0	401-0006	м3	15,93	2 823,77	44 982,66
13	13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,162	932,14	151,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 к ЗТ = 0					
14	14	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	270	186,37	50 319,90
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	358,8048		60 679,91
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	23,1947		5 606,35
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	381,9995		66 286,26
		Стоимость эксплуатации машин					34 430,98
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					179 562,25
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					140 592,73
		Стоимость материалов					320 154,98
		Итого прямые затраты по разделу					415 265,87
		Накладные расходы					71 735,00
		в том числе:					
		85,5%×0,85=73% от ФОТ текущего 1436,2					1 048,43
		127,8%×0,85=109% от ФОТ текущего 64850,06					70 686,57
		Сметная прибыль					42 640,85
		в том числе:					
		42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 1436,2					488,31
		80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 64850,06					42 152,54
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					529 641,72
		Детская игровая площадка					
15	15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м3 грунта	0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	2,478	1 165,12	2 887,17
16	16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 4 км, I класс груза	03-21-01-004	1 т груза	72	61,59	4 434,48
17	17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м3	3	24,52	73,56
18	18	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	66	644,71	42 550,86
19	19	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256	166,09	8 845,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476	264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
20	20	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
21	21	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,2	13 973,51	2 794,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,032	153,23	311,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,208	227,41	502,12
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,208	1 124,70	2 483,34
22	22	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3х0,3х0,5м)х20шт.=0,9м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,009	358 182,37	3 223,63
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,62	153,23	248,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,162	264,85	42,91
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,162	1 391,12	225,36
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,432	2,02	0,87
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00117	875,80	1,02
		Рогожа	101-1668	м2	2,25	76,92	173,07
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,918	2 805,05	2 575,04
		Вода	411-0001	м3	0,0018	24,52	0,04
23	23	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,918	2 805,05	-2 575,04
24	24	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,918	3 284,54	3 015,21
25	25	Песочница "Забава большая", размеры 2160х2230х220 мм	116-0311-03	шт.	1	9 409,10	9 409,10
26	26	Диван-качели, размеры 2340х1200х2000 мм	116-0455-09	шт.	1	19 095,52	19 095,52
27	27	Качалка-балансир малый, размеры 2100х300х900 мм	116-0463-04	шт.	1	12 634,94	12 634,94
28	28	Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200х820х1200 мм	116-0463-08	шт.	1	28 326,38	28 326,38
29	29	Детский игровой комплекс "Играйте с нами", размеры 4380х3540х3000 мм	116-0033-32	шт.	1	101 427,89	101 427,89
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	66,34		10 890,14
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,652		3 421,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	79,992		14 311,20
		Стоимость эксплуатации машин					24 009,87
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					16 920,67
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					250 398,94
		Стоимость материалов					267 319,61
		Итого прямые затраты по разделу					302 219,62
		Накладные расходы					14 888,04
		в том числе:					
		72%х0,85=61% от ФОТ текущего 813,48					496,22
		85,5%х0,85=73% от ФОТ текущего 656,3					479,10
		94,5%х0,85=80% от ФОТ текущего 291,14					232,91
		127,8%х0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28					13 679,81
		Сметная прибыль					8 761,10
		в том числе:					
		38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 813,48					252,18
		42,5%х0,8=34% от ФОТ текущего 656,3					223,14
		55,25%х0,8=44% от ФОТ текущего 291,14					128,10
		80,75%х0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28					8 157,68
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					325 868,76

1	2	3	4	5	6	7	8
Спортивная площадка							
30	30	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м3 грунта	0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	2,478	1 165,12	2 887,17
31	31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза	72	71,69	5 161,68
32	32	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м3	3	24,52	73,56
33	33	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	66	644,71	42 550,86
34	34	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256	166,09	8 845,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476	264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
35	35	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
36	36	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,32	13 973,51	4 471,52
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,2512	153,23	498,18
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,5328	227,41	803,39
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	3,5328	1 124,70	3 973,34
37	37	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3х0,3х0,5м)х32шт.=1,44 м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,0144	358 182,37	5 157,83
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,592	153,23	397,17
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2592	264,85	68,65
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,2592	1 391,12	360,58
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,6912	2,02	1,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001872	875,80	1,64
		Рогожа	101-1668	м2	3,6	76,92	276,91
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	1,4688	2 805,05	4 120,06
		Вода	411-0001	м3	0,00288	24,52	0,07
38	38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-1,4688	2 805,05	-4 120,06
39	39	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,4688	3 284,54	4 824,33
40	40	Спортивный комплекс с рукоходом с парой колец, турником, лианой, стенкой для лазанья, канатом и баскетбольным кольцом, размеры 3850x4125x2850 мм	116-0154-09	шт.	1	74 041,13	74 041,13
41	41	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, размеры 2900x1900x2500 мм	116-0360	компл.	1	52 803,98	52 803,98
42	42	Тренажер "Лавка-пресс", размеры 1020x500x620 мм	116-0384-04	шт.	1	7 846,15	7 846,15
43	43	Тренажер "Маятник", размеры 560x760x1500 мм	116-0384-06	шт.	1	22 436,53	22 436,53
44	44	Тренажер "Шаговый", размеры 965x760x1500 мм	116-0384-07	шт.	1	32 231,47	32 231,47
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	68,5312		11 225,90
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	15,074		3 748,07
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	83,6052		14 973,97
		Стоимость эксплуатации машин					25 636,24
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					18 569,56
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					269 855,67
		Стоимость материалов					288 425,23
		Итого прямые затраты по разделу					325 287,37
		Накладные расходы					15 325,53
		в том числе:					
		72%x0,85=61% от ФОТ текущего	1301,57				793,96
		85,5%x0,85=73% от ФОТ текущего	656,3				479,10
		94,5%x0,85=80% от ФОТ текущего	465,82				372,66
		127,8%x0,85=109% от ФОТ текущего	12550,28				13 679,81
		Сметная прибыль					8 989,27
		в том числе:					
		38,25%x0,8=31% от ФОТ текущего	1301,57				403,49
		42,5%x0,8=34% от ФОТ текущего	656,3				223,14
		55,25%x0,8=44% от ФОТ текущего	465,82				204,96
		80,75%x0,8=65% от ФОТ текущего	12550,28				8 157,68
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					349 602,17
		Скамейки, урны					
45	45	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (12шт*4ямы+12шт.*2ямы)	01-02-031-03	100 ям	0,72	13 973,51	10 060,93
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,3152	153,23	1 120,91
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	7,9488	227,41	1 807,64
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	7,9488	1 124,70	8 940,02
46	46	Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,4)x72=2,592м3	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0259	358 182,37	9 276,93
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,662	153,23	714,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,4662	264,85	123,47
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,4662	1 391,12	648,54
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	1,2432	2,02	2,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,003367	875,80	2,95
		Рогожа	101-1668	м2	6,475	76,92	498,06
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	2,6418	2 805,05	7 410,38
		Вода	411-0001	м3	0,00518	24,52	0,13
47	47	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-2,6438	2 805,05	-7 415,99
48	48	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	2,644	3 284,54	8 684,32
49	49	Скамья со спинкой, размеры 1950x480x900 мм	116-0344-10	шт.	12	7 264,58	87 174,96
50	50	Урна металлическая опрокидывающаяся	116-0093	шт.	12	2 674,60	32 095,20
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	11,9772		1 835,27
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	8,415		1 931,11
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	20,3922		3 766,38
		Стоимость эксплуатации машин					9 594,02
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					7 908,57
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					120 538,49
		Стоимость материалов					128 447,06
		Итого прямые затраты по разделу					139 876,35
		Накладные расходы					2 456,68
		в том числе:					
		72%x0,85=61% от ФОТ текущего 2928,55					1 786,42
		94,5%x0,85=80% от ФОТ текущего 837,83					670,26
		Сметная прибыль					1 276,50
		в том числе:					
		38,25%x0,8=31% от ФОТ текущего 2928,55					907,85
		55,25%x0,8=44% от ФОТ текущего 837,83					368,65
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					143 609,53
		Ограждение территории					
51	51	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,7	13 973,51	9 781,45
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,112	153,23	1 089,77
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	7,728	227,41	1 757,42
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	7,728	1 124,70	8 691,68
52	52	Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,4)x70шт=2,52м3	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0252	358 182,37	9 026,19
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,536	153,23	695,05
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,4536	264,85	120,14
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,4536	1 391,12	631,01
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	1,2096	2,02	2,44
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,003276	875,80	2,87
		Рогожа	101-1668	м2	6,3	76,92	484,60
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	2,5704	2 805,05	7 210,10
		Вода	411-0001	м3	0,00504	24,52	0,12
53	53	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-2,5704	2 805,05	-7 210,10
54	54	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	2,5704	3 284,54	8 442,58
55	55	Ограждение металлическое, размеры 2000x30x500 мм	116-0429-03	шт.	68	2 776,14	188 777,52
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	11,648		1 784,82
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	8,1816		1 877,56
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	19,8296		3 662,38

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Стоимость эксплуатации машин					9 328,00	
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					7 694,82	
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					190 010,00	
		Стоимость материалов					197 704,82	
		Итого прямые затраты по разделу					208 817,64	
		Накладные расходы					2 388,94	
		в том числе:						
		72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 2847,19					1 736,79	
		94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 815,19					652,15	
		Сметная прибыль					1 241,31	
		в том числе:						
		38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 2847,19					882,63	
		55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 815,19					358,68	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					212 447,89	
		Освещение - 12 светильников						
56	56	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (прим.)	08-02-369-01	1 шт.		12	677,65	8 131,79
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	11,04		206,20	2 276,45
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,6	1-2046					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,36		264,85	889,90
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,24		1 254,20	301,01
		Вышка телескопическая 25 м	031050	маш.-ч	3,12		970,68	3 028,52
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,24		875,80	210,19
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	3		7,48	22,44
		Лента ПВХ-304	101-1951	кг	0,144		206,40	29,72
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,12		112,96	13,56
		Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	502-0246	т	0,006		371 163,19	2 226,98
		Трубка полихлорвиниловая	507-0701	кг	0,12		191,01	22,92
57	57	Светодиодный консольный светильник LuxON Uniled S 80 Lux	товарная накладная №364 от 21.05.2018	шт.		12	7 150,00	85 800,00
		Итого по разделу						
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	11,04			2 276,45
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	3,36			889,90
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	14,4			3 166,35
		Стоимость эксплуатации машин						3 539,72
		Стоимость материалов, учтенных в расценках						2 315,62
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках						85 800,00
		Стоимость материалов						88 115,62
		Итого прямые затраты по разделу						93 931,79
		Накладные расходы						
		Накладные расходы 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 3166,35						2 564,74
		Сметная прибыль						
		Сметная прибыль 65% \times 0,8=52% от ФОТ текущего 3166,35						1 646,50
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						98 143,03
		Итого по акту						
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	528,3412			88 692,49
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	71,8773			17 474,05
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	600,2185			106 166,54
		Стоимость эксплуатации машин						106 538,83
		Стоимость материалов, учтенных в расценках						232 971,49

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						1 057 195,83
	Стоимость материалов						1 290 167,32
	Итого прямые затраты по акту						1 485 398,64
	Накладные расходы						109 358,93
	в том числе:						
	72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 7890,79						4 813,39
	85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 2748,8						2 006,63
	94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 2409,98						1 927,98
	95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 3166,35						2 564,74
	127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 89950,62						98 046,19
	Сметная прибыль						64 555,53
	в том числе:						
	38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 7890,79						2 446,15
	42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 2748,8						934,59
	55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 2409,98						1 060,39
	65% \times 0,8=52% от ФОТ текущего 3166,35						1 646,50
	80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 89950,62						58 467,90
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						1 659 313,10
	0,984999992 Понижающий коэффициент						1 634 423,39
	Налоги						
	НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ						294 196,21
	Итого						1 928 619,61
	ВСЕГО ПО АКТУ						1 928 619,60



Сдал: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность)

А.Ю. Ксенафонтов
расшифровка подписи

Принял: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
(должность)

А.Н.Селезнев
расшифровка подписи



Общественный контроль: Юлия Киселева С.А.

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САМАРА		БИК	043601607
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000607
ИНН 6330063680	КПП 631601001	Сч. №	40702810554400017160
ООО "УНИВЕРСАЛМОНТАЖСТРОЙ"			
Получатель			

Счет на оплату № 13 от 31 мая 2018 г.

Поставщик **ООО "УНИВЕРСАЛМОНТАЖСТРОЙ", ИНН 6330063680, КПП 631601001, 443124,**
(Исполнитель: Самарская обл, Самара г, 5-я просека, дом № 104 оф.8

Покупатель **Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, ИНН 6367061249, КПП 636701001, 443530, Самарская область, с.Дубовый Умет, ул.Советская, дом № 120**

Основание: **Основной**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Благоустройство дворовой территории в с.п.Рождествено ж/домов №1, 1к, 3, 5, 7, 9 ул.Шоссейная по договору №5МК-УГ/2018 от 15.05.2018г согласно акта-1 от 31.05.2018г		шт	1 928 619,60	1 928 619,60

Итого: 1 928 619,60
В том числе НДС: 294 196,21
Всего к оплате: 1 928 619,60

Всего наименований 1, на сумму 1 928 619,60 руб.

Один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот девятнадцать рублей 60 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается налично-денежно прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель



Ксенафонтов А. Ю.

Бухгалтер

Ксенафонтов А. Ю.

Счет-фактура № 28 от 31 мая 2018 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "УНИВЕРСАЛМОНТАЖСТРОЙ"

Адрес: 443124, Самарская обл, Самара г, 5-я просека, дом № 104 оф.8

ИНН/КПП продавца: 6330063680/631601001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области

Адрес: 443530, Самарская область, с.Дубовый Умет, ул.Советская, дом № 120

ИНН/КПП покупателя: 6367061249/636701001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Благоустройство дворовой территории в с.п.Рождествено ж/домов №1,1к,3,5,7,9 ул.Шосейная по договору №5МК-УГ/2018 от 15.05.2018г согласно акта-1 от 31.05.2018г	--	--	--	--	--	1 634 423,39	без акциза	18%	294 196,21	1 928 619,60	--	--	--
Всего к оплате						1 634 423,39			294 196,21	1 928 619,60			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Ксенафонтов А. Ю.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Ксенафонтов А. Ю.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)
