

ИНВЕТОР	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код		
		по ОКПО	0322001		
ЗАКАЗЧИК	(Генподрядчик)	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627	
			по ОКПО	88544050	
ПОДРЯДЧИК	(Субподрядчик)	ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4 (организация, адрес, телефон, факс)	Вид деятельности по ОКДП		
СТРОЙКА	(наименование, адрес)	Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский Самарской области	Договор подряда (контракт)		
			номер	6МК-УГ/2019	
			дата	29.05.2019	
			Вид операции		
		Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		ФЗ-1	01.07.2019	с	по
				29.05.2019	01.07.2019

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :


1	Территория прилегающая к зданиям ДК "НИВА" п.Верхняя Подстепновка	Акт-1	1 269 780,43	1 269 780,43	1 269 780,43
	Итого		1 269 780,43	1 269 780,43	1 269 780,43
	Сумма НДС		253 956,09	253 956,09	253 956,09
	Всего с учетом НДС		1 523 736,52	1 523 736,52	1 523 736,52

Заказчик И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Подрядчик Директор ООО "СК "Перспектива"

М.В. Солдатов

В.А. Озерский

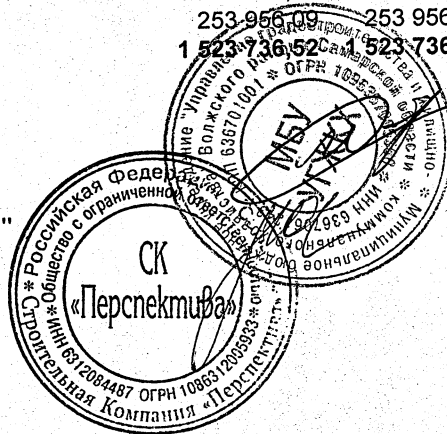

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код		
		по ОКПО	0322005		
		Заказчик	по ОКПО	60264627	
		(генподрядчик)		88544050	
		Подрядчик	по ОКПО	6МК-УГ/2019	
(субподрядчик)	29.05.2019				
Стройка	Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский Самарской области	Вид операции			
Объект	Территория прилегающая к здания ДК "НИВА" п.Верхняя Подстепновка	Вид деятельности по ОКДП			
	(наименование, адрес)	Договор подряда (контракт)			
		номер	6МК-УГ/2019		
		дата	29.05.2019		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1	01/07/2019	29/05/2019	01/07/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1 523 736,52 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуара - 674,5 м2					
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (674,5м2 *0,14м = 94,43м3)	01-02-057-01	100 м3 грунта	0,9443	22 506,14	21 252,55
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	111,4274	190,73	21 252,55
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
2	2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) - (94,43м3 x 1,2т/м3 = 113,32т)	01-01-01-039	1 т груза	113,32	58,34	6 611,09
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, I класс груза	03-21-01-010	1 т груза	113,32	144,69	16 396,27
4	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6745	34 703,23	23 407,31
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	10,6031	196,01	2 078,31
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	9,3621	312,99	2 930,24
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,893605	856,42	2 478,14
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,193865	2 506,32	2 992,21
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,77546	3 156,53	15 073,88
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,49913	1 398,36	697,96
		Вода	411-0001	м3	3,3725	25,74	86,81
5	5	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	74,2	683,16	50 690,47
6	6	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	6,745	9 158,57	61 774,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	176,9888	206,73	36 588,89
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	21,3817	269,56	5 763,65
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	7,75675	856,42	6 643,04
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	9,9826	1 312,50	13 102,16
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	3,6423	1 398,36	5 093,25
		Вода	411-0001	м3	13,49	25,74	347,23
7	7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	117,363	893,63	104 879,10
8	8	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	6,745	32 371,91	218 348,52
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	101,9844	227,12	23 162,70
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3373	279,29	94,20
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,1349	1 340,99	180,90
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,20235	856,42	173,30
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	5,73325	523,95	3 003,94
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,1349	1 060,13	143,01
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,4047	15 740,10	6 370,02
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	3,3725	693,17	2 337,72
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	48,1593	3 799,41	182 976,93
9	9	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,4047	15 740,10	-6 370,02
10	10	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-3,3725	693,17	-2 337,72
11	11	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-48,1593	3 799,41	-182 976,93
12	12	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,4047	14 207,25	5 749,67
13	13	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	48,1593	3 072,45	147 967,04
14	14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	6,745	10 395,12	70 115,05
		Добавлять до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	31,2968	227,12	7 108,13
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,8886	523,95	989,53
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	16,3229	3 799,41	62 017,39
15	15	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-16,3229	3 799,41	-62 017,39
16	16	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	16,3229	3 072,45	50 151,29
17	17	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	3,17	37 764,76	119 714,30
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	241,1736	206,73	49 857,82
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,1556	329,75	710,81
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	2,1556	1 340,99	2 890,64
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,1268	1 060,13	134,42
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00317	56 139,81	177,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,5389	3 501,59	1 887,01
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	18,703	3 433,17	64 210,58
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,1902	2 922,58	555,87
		Камни бортовые	413-9010	м	317		
18	18	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-18,703	3 433,17	-64 210,58
19	19	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,1902	2 922,58	-555,87
20	20	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	18,703	2 952,53	55 221,17
21	21	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,1902	964,45	183,44
22	22	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	317	189,55	60 087,35
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	673,4741		140 048,40
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	33,2367		9 498,90
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	706,7108		149 547,30
		Стоимость эксплуатации машин					53 596,38
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					320 967,52
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					179 468,38
		Стоимость материалов					500 435,90
		Итого прямые затраты по разделу					694 080,68
		Накладные расходы					179 519,12
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 128294,75	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				164 217,28
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 21252,55	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				15 301,84
		Сметная прибыль					111 994,72
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 128294,75	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				103 918,75
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 21252,55	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				8 075,97
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					985 594,52
		Устройство покрытия площадки Воркаут - 210м2					
23	23	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (210м2 x 0,3м =63м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,063	70 492,82	4 441,05
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			1 115,38
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,3825	329,75	4 441,05
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	3,38247	1 312,96	
24	24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, I класс груза	03-21-01-010	1 т груза	110,25	144,69	15 952,07
25	25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (210м2 x 0,12=25,2м3)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,21	34 703,23	7 287,69
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,3012	196,01	647,07
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				912,30
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,9148	312,99	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,9009	856,42	771,55
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,3717	2 506,32	931,60
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	1,4868	3 156,53	4 693,13
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,1554	1 398,36	217,31
		Вода	411-0001	м3	1,05	25,74	27,03
26	26	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	23,1	683,16	15 781,00
27	27	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	2,1	9 158,57	19 233,00
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	55,104	206,73	11 391,65
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029	чел.-ч	6,657	269,56	1 794,46
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,415	856,42	2 068,25
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,415	856,42	2 068,25
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	3,108	1 312,50	4 079,25
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,134	1 398,36	1 585,74
		Щебень известняковый или кирпичный	408-9081	м3	36,54		
		Вода	411-0001	м3	4,2	25,74	108,11
28	28	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	36,54	893,63	32 653,24
29	29	Розлив вяжущих материалов (210м2 x 0,7л/м2=147л)	27-06-026-01	1 т	0,147	16 602,29	2 440,54
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,097	264,47	25,65
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,04851	1 181,80	57,33
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,15141	15 740,10	2 383,21
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,15141	15 740,10	-2 383,21
30	30	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,15141	15 740,10	-2 383,21
31	31	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,15141	14 207,25	2 151,12
32	32	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	2,1	32 371,91	67 980,99
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	31,752	227,12	7 211,51
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037	чел.-ч	0,105	279,33	29,33
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,042	1 340,99	56,32
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,063	856,42	53,95
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,785	523,95	935,25
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,042	1 060,13	44,53
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,126	15 740,10	1 983,25
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,126	15 740,10	1 983,25
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	1,05	693,17	727,83
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	14,994	3 799,41	56 968,35
33	33	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,126	15 740,10	-1 983,25
34	34	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-1,05	693,17	-727,83
35	35	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-14,994	3 799,41	-56 968,35
36	36	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,126	14 207,25	1 790,11
37	37	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	14,994	3 072,45	46 068,32
38	38	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	2,1	5 197,56	10 914,87
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,872	227,12	1 106,53
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037	чел.-ч	0,294	523,95	154,04
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,294	523,95	154,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	2,541	3 799,41	9 654,30
39	39	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-2,541	3 799,41	-9 654,30
40	40	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	5,082	3 072,45	15 614,19
41	49	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня чел.-ч	0,56	37 764,76	21 148,27
		Оплата труда рабочих	1		42,6048	206,73	8 807,69
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3808	329,75	125,57
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,3808	1 340,99	510,65
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0224	1 060,13	23,75
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00056	56 139,81	31,44
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,0952	3 501,59	333,35
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	3,304	3 433,17	11 343,19
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0336	2 922,58	98,20
		Камни бортовые	413-9010	м	56		
42	50	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-3,304	3 433,17	-11 343,19
43	51	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0336	2 922,58	-98,20
44	52	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	3,304	2 952,53	9 755,16
45	53	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0336	964,45	32,41
46	54	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	56	189,55	10 614,80
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	137,634		29 164,45
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,5371		4 002,69
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	151,1711		33 167,14
		Стоимость эксплуатации машин					20 623,70
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					83 658,26
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					67 254,09
		Стоимость материалов					150 912,35
		Итого прямые затраты по разделу					200 700,50
		Накладные расходы					41 985,48
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 32051,76	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				41 026,25
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 1115,38	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				959,23
		Сметная прибыль					26 441,54
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 32051,76	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				25 961,93
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 1115,38	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				479,61
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					269 127,52
		МАФы площадки Воркаут					
		Итого по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					


1	2	3	4	5	6	7	8
Ограждение площадки							
Итоги по разделу							
Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью							
Благоустройство							
Итоги по разделу							
Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью							
Освещение							
47	82	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	01-01-009-01	1000 м3 грунта	0,0305	28 541,30	870,51
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			154,28
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,4679	329,73	870,51
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3	060249	маш.-ч	0,46787	1 860,58	
48	83	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (прим. - Прокладка гофротрубы в траншее)	34-02-003-01	1 канало-километр трубопровод а	0,148	195 703,06	28 964,03
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	19,684	206,73	4 069,27
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				4,51
		Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 <Экстра>, АИ-93	101-0070	т	0,000118	38 237,09	
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	102-0097	м3	0,01184	2 467,30	29,21
		Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	507-0546	м	148	167,98	24 861,04
49	84	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	507-0546	м	-148	167,98	-24 861,04
50	85	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм (прим 50мм)	103-1059	м	148	23,24	3 439,52
51	86	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	8,7	683,16	5 943,49
52	89	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	01-02-061-01	100 м3 грунта	0,218	16 226,48	3 537,37
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	19,293	183,35	3 537,37
		Рабочий строитель среднего разряда 1,5	1-1015				
Итоги по разделу							
Оплата труда рабочих							
Оплата труда машинистов							
Фонд оплаты труда							
Стоимость эксплуатации машин							
Стоимость материалов, учтенных в расценках							
Стоимость материалов, не учтенных в расценках							
Стоимость материалов							
Итого прямые затраты по разделу							
Накладные расходы							
в том числе:							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 154,28							
Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 3537,37							
Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 90% от ФОТ текущего 4069,27							
Сметная прибыль							
в том числе:							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 154,28							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 3537,37	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				1 344,20
		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55% от ФОТ текущего 4069,27	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1, прим.п.				2 238,10
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					27 884,45
		Итого по акту					176 819,49
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	850,0851		13 655,87
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	47,2417		190 475,36
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	897,3268		75 090,59
		Стоимость эксплуатации машин					429 520,54
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					231 244,44
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					660 764,98
		Стоимость материалов					912 675,06
		Итого прямые затраты по акту					227 846,53
		Накладные расходы в том числе:					205 243,53
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 160346,51	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				1 091,91
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 1269,66	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				17 848,75
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 24789,92	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				3 662,34
		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 90% от ФОТ текущего 4069,27	МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1, прим.п.1				142 084,90
		Сметная прибыль в том числе:					129 880,68
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 160346,51	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				545,95
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 1269,66	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				9 420,17
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 24789,92	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				2 238,10
		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55% от ФОТ текущего 4069,27	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1, прим.п.				1 282 606,49
		Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью					1 269 780,43
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99					253 956,09
		Налоги					1 523 736,52
		НДС, 20% ф3 РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ					1 523 736,52
		Итого ВСЕГО ПО АКТУ					

Сдал:

Директор ООО "СК "Перспектива"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской области



В.А. Озерский

М.В. Солдатов

Общая проверка! 24.07.19.
