

ИНВЕСТОР (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	О322001
	по ОКПО	60264627
	по ОКПО	04247312
ЗАКАЗЧИК (Генподрядчик)	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 (организация, адрес, телефон, факс)	
ПОДРЯДЧИК (Субподрядчик)	ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д. 110Е, каб. 207 (организация, адрес, телефон, факс)	
СТРОЙКА	Благоустройство дворовых территорий (наименование, адрес)	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер
		дата
Вид операции		
1МК-УГ/2019		
25.04.2019		
Ф3-5		27.08.2019
Дата составления		Отчетный период
		с
		по
		09.08.2019
		27.08.2019

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :				
	территории по адресу: с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 11, 13, 15				
1		Акт-1	318 200,72	318 200,72	
	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, ул. Победы, д. 1				
2		Акт-2	83 982,77	83 982,77	
	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, Ленинская, д. 10				
3		Акт-3	107 247,52	107 247,52	
	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 12				
4		Акт-4	131 256,21	131 256,21	
	территории по адресу: с. Воскресенка, ул. Крестьянская, 78, 80, 80а				
5		Акт-5	314 551,43	314 551,43	
	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Черновский, пер. Коммунальный, д. 8, ул. Школьная, д. 13				
6		Акт-6	390 926,01	390 926,01	
	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 6, 6а				
7		Акт-7	604 620,90	604 620,90	
	территории по адресу: п. Смышляевка, ул. Первомайская, 10				
8		Акт-8	123 142,19	123 142,19	
	территории по адресу: п. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 12				
9		Акт-9	343 857,23	343 857,23	
	территории по адресу: п. Смышляевка, ул. Октябрьская, 26				
10		Акт-10	309 112,88	309 112,88	

1	2	3	4	5	6
11	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Петра Дубрава, ул.Южная, д.6, 6а	Акт-11	297 784,92	297 784,92	
12	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Петра Дубрава, ул.Южная, д.8	Акт-12	371 272,98	371 272,98	
13	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Верхняя Подстепновка, ул.Дорожная, д.9,11,13	Акт-13	797 006,54	797 006,54	
14	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Петра Дубрава, ул.Южная, д.6, 6а	Акт-14	-6 044,10	-6 044,10	
15	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, ул.Крестьянская, 78, 80, 80а	Акт-15	7 362,14	7 362,14	
16	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, ул.Крестьянская, 78, 80, 80а	Акт-16	43 718,71	43 718,71	
17	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, ул.Ленинская, д.11,13,15	Акт-17	8 524,54	8 524,54	
18	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, ул.Ленинская, д.11,13,15	Акт-18	50 744,93	50 744,93	
19	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Черновский, пер.Коммунальный, д.8, ул.Школьная, д.13	Акт-19	33 710,68	33 710,68	
20	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Черновский, пер.Коммунальный, д.8, ул.Школьная, д.13	Акт-20	210 786,62	210 786,62	
21	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Верхняя Подстепновка, ул.Дорожная, д.9,11,13	Акт-21	11 624,39	11 624,39	
22	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Верхняя Подстепновка, ул.Дорожная, д.9,11,13	Акт-22	70 506,17	70 506,17	
23	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, ул.Ленинская, д.11,13,15	Акт-23	278 725,99	278 725,99	
24	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, ул.Победы, д.1	Акт-24	96 250,12	96 250,12	
25	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, ул.Ленинская, д.10	Акт-25	49 327,59	49 327,59	

1	2	3	4	5	6
26	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, ул.Ленинская, д.12	Акт-26	49 327,59	49 327,59	
27	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, ул.Крестьянская, 78, 80, 80а	Акт-27	372 365,70	372 365,70	
28	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Смышляевка, ул.Первомайская, 10	Акт-28	294 621,59	294 621,59	
29	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Смышляевка, ул.Первомайская, д.12	Акт-29	166 040,64	166 040,64	
30	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Смышляевка, ул.Октябрьская, 26	Акт-30	221 126,10	221 126,10	
31	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Петра Дубрава, ул. Южная, д.2, 2а	Акт-31	364 988,05	364 988,05	
32	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Петра Дубрава, ул.Южная, д.6, 6а	Акт-32	286 846,69	286 846,69	
33	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Петра Дубрава, ул.Южная, д.8	Акт-33	359 603,73	359 603,73	
34	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Верхняя Подстепновка, ул.Дорожная, д.9,11,13	Акт-34	477 269,47	477 269,47	
35	Благоустройство дворовой территории по адресу: п.Черновский, пер.Коммунальный, д.8, ул.Школьная, д.13	Акт-35	177 267,11	177 267,11	
36	Благоустройство дворовой территории по адресу:с. Воскресенка, ул.Ленинская, д.11,13,15	Акт-36	323 727,40	323 727,40	323 727,40
37	Благоустройство дворовой территории по адресу:с. Воскресенка, ул.Крестьянская, 78, 80, 80а	Акт-37	126 532,08	126 532,08	126 532,08
38	Благоустройство дворовой территории по адресу:п.Смышляевка, ул.Первомайская, д.12	Акт-38	315 356,82	315 356,82	315 356,82
39	Благоустройство дворовой территории по адресу:п.Смышляевка, ул.Октябрьская, 26	Акт-39	194 664,69	194 664,69	194 664,69

1	2	3	4	5	6
40	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 6, 6а	Акт-40	447 728,79	447 728,79	447 728,79
41	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 8	Акт-41	350 396,44	350 396,44	350 396,44
42	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 9, 11, 13	Акт-42	399 062,63	399 062,63	399 062,63
43	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Черновский, пер. Коммунальный, д. 8, ул. Школьная, д. 13	Акт-43	243 330,88	243 330,88	243 330,88
Итого			10 218 456,48	10 218 456,48	2 400 799,73
Сумма НДС			0 043 691,31	2 043 691,31	480 159,96
Всего с учетом НДС			12 262 147,79	12 262 147,79	2 880 959,69

И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ"
Волжского района Самарской области

Заказчик

Подрядчик

Директор ООО "ВПКстрой"



М.В. Солдатов

В. Шкалей

Инвестор (организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКУД по ОКПО	Код О322005	
Заказчик (генподрядчик)	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627	
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д. 110Е, каб. 207 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	04247312	
Стройка	Благоустройство дворовой территории (наименование, адрес)			
Объект	Дворовая территория по адресу: с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 11, 13, 15 (наименование)			
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	1МК-УГ/2019	
		дата	25.04.2019	
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-36	27/08/2019	09/08/2019	27/08/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

388 472,88 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Детская площадка							
1	41	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (прим.-Устройство покрытия цветного для детских площадок "Мастерфайбр" толщ. 10 мм)	27-09-022-01	1 м2 покрытия	166,3	5 045,99	839 147,16 ✓
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	19,956	234,82	4 686,07
		Рабочий строитель среднего разряда 4	1-1040				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,663	267,74	445,25
		Электростанции передвижные 2 кВт	040101	маш.-ч	0,9978	360,84	360,05
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	0,6652	897,37	596,93
		Горелки газопламенные	150401	маш.-ч	0,9978	20,79	20,74
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	4,989	1 045,31	5 215,05
		Спецавтомашины типа УАЗ	400302	маш.-ч	4,989	1 359,28	6 781,45
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	9,6454	36,50	352,06
		Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм	101-2782	м	582,05	7,02	4 085,99
		Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	4,1575	1 712,07	7 117,93
		Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	166,3	177,63	295 398,69
		Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент B эпоксидной смолы)	113-0420	кг	166,3	1 186,60	197 331,58
		Смола эпоксидная марки Turegrip LT A модифицированная (компонент A эпоксидной смолы)	113-0456	кг	166,3	1 542,28	256 481,16
		Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	133,04	456,40	60 719,46
2	42	Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	-4,1575	1 712,07	-7 117,93 ✓


1	2	3	4	5	6	7	8
3	43	Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	-1663	177,63	- 295 398,69 ✓
4	44	Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент B эпоксидной смолы)	113-0420	кг	-166,3	1 186,60	- 197 331,58 ✓
5	45	Смола эпоксидная марки Turegrip LT A модифицированная (компонент A эпоксидной смолы)	113-0456	кг	-166,3	1 542,28	- 256 481,16 ✓
6	46	Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	-133,04	456,40	-60 719,46 ✓
7	47	Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101>; расход 0,3 кг/1 м2	101-5870	кг	49,89	263,82	13 161,98 ✓
8	48	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	01.6.03.02- 0003	м2	166,3	1 670,13	277 742,62 ✓
Итоги по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	19,956		4 686,07
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,663		445,25
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	21,619		5 131,32
		Стоимость эксплуатации машин					12 974,22
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					821 486,87
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 526 144,22
		Стоимость материалов					295 342,65
		Итого прямые затраты по разделу					313 002,94
		Накладные расходы					6 568,09
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 5131,32	МДС 81- 33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				6 568,09
		Сметная прибыль					4 156,37
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 5131,32	Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				4 156,37
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					323 727,40
Ограждение							
Итоги по разделу							
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
Итоги по акту							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	19,956		4 686,07
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,663		445,25
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	21,619		5 131,32
		Стоимость эксплуатации машин					12 974,22
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					821 486,87
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 526 144,22
		Стоимость материалов					295 342,65
		Итого прямые затраты по акту					313 002,94
		Накладные расходы					6 568,09
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 5131,32	МДС 81- 33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				6 568,09
		Сметная прибыль					4 156,37
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 5131,32	Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				4 156,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью					323 727,40
	Налоги						
	НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ						64 745,48
	Итого						388 472,88
	ВСЕГО ПО АКТУ						388 472,88

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Примечание:

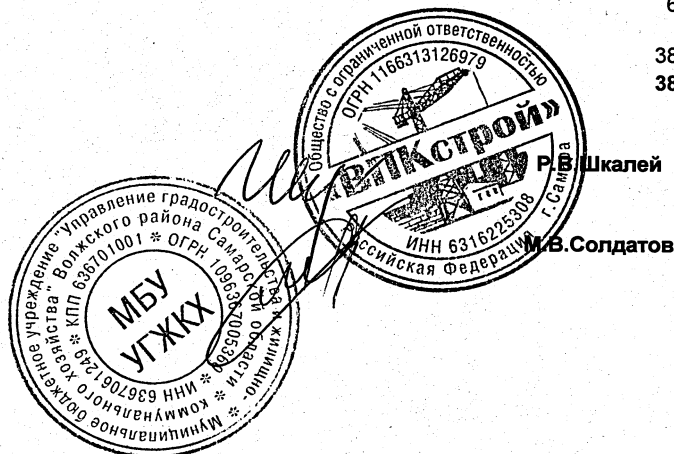

Инвестор (организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКУД по ОКПО	Код О322005	
Заказчик (генподрядчик)	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627	
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ВПКСтрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д. 110Е, каб. 207 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	04247312	
Стройка	Благоустройство дворовой территории (наименование, адрес)			
Объект	Дворовая территория по адресу: с. Воскресенка, ул. Крестьянская, 78, 80, 80а (наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	1МК-УГ/2019	
		дата	25.04.2019	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-37	27/08/2019	09/08/2019	27/08/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

151 838,50 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуара					
		Итого по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Детская площадка					
1	40	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (прим.-Устройство покрытия цветного для детских площадок "Мастерфайбр" толщ. 10 мм)	27-09-022-01	1 м2 покрытия	65	5 045,99	327 988,98
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,8	234,82	1 831,60
		Рабочий строитель среднего разряда 4	1-1040				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,65	267,74	174,03
		Электростанции передвижные 2 кВт	040101	маш.-ч	0,39	360,84	140,73
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	0,26	897,37	233,32
		Горелки газопламенные	150401	маш.-ч	0,39	20,79	8,11
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	1,95	1 045,31	2 038,35
		Спецавтомашины типа УАЗ	400302	маш.-ч	1,95	1 359,28	2 650,60
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	3,77	36,50	137,61
		Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм	101-2782	м	227,5	7,02	1 597,05
		Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	1,625	1 712,07	2 782,11
		Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	650	177,63	115 459,50
		Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	113-0420	кг	65	1 186,60	77 129,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	113-0456	кг	65	1 542,28	100 248,20
		Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	52	456,40	23 732,80
2	41	Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	-1,625	1 712,07	-2 782,11
3	42	Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	-650	177,63	-115 459,50
4	43	Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	113-0420	кг	-65	1 186,60	-77 129,00
5	44	Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	113-0456	кг	-65	1 542,28	-100 248,20
6	45	Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	-52	456,40	-23 732,80
7	46	Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101>; расход 0,3 кг/1 м2	101-5870	кг	19,5	263,82	5 144,49
8	47	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	01.6.03.02-0003	м2	65	1 670,13	108 558,45
Итоги по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	7,8		1 831,60
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,65		174,03
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	8,45		2 005,63
		Стоимость эксплуатации машин					5 071,11
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					321 086,27
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-205 648,67
		Стоимость материалов					115 437,60
		Итого прямые затраты по разделу					122 340,31
		Накладные расходы					2 567,21
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 2005,63	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				2 567,21
		Сметная прибыль					1 624,56
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 2005,63	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				1 624,56
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					126 532,08
Ограждение							
Итоги по разделу							
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
Итоги по акту							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	7,8		1 831,60
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,65		174,03
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	8,45		2 005,63
		Стоимость эксплуатации машин					5 071,11
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					321 086,27
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-205 648,67
		Стоимость материалов					115 437,60
		Итого прямые затраты по акту					122 340,31
		Накладные расходы					2 567,21
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 2005,63	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				2 567,21
		Сметная прибыль					1 624,56
		в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 2005,63		Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				1 624,56

**Итого по акту с накладными расходами и
сметной прибылью**

126 532,08

Налоги

НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ

25 306,42

Итого

151 838,50


ВСЕГО ПО АКТУ

151 838,50

Сдал: **Директор ООО "ВПКстрой"**

Принял: **И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской
области**

Примечание:

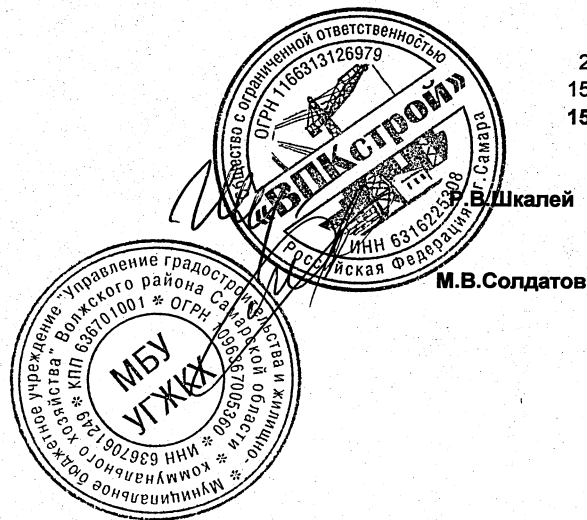

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код	
			0322005	
Заказчик (генподрядчик)	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627	
			04247312	
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д. 110Е, каб. 207 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Благоустройство дворовой территории (наименование, адрес)			
Объект	Дворовая территория по адресу: п. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 12 (наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	1МК-УГ/2019
			дата	25.04.2019
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-38	27/08/2019	09/08/2019	27/08/2019

АКТ**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 378 428,18 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по- рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Детская площадка							
1	41	Устройство цветного противоскользкого дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (прим.-Устройство покрытия цветного для детских площадок "Мастерфайбр" толщ. 10 мм)	27-09-022-01	1 м2 покрытия	162	5 045,99	817 449,43 ✓
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	19,44	234,82	4 564,90
		Рабочий строитель среднего разряда 4	1-1040				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,62	267,74	433,74
		Электростанции передвижные 2 кВт	040101	маш.-ч	0,972	360,84	350,74
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	0,648	897,37	581,50
		Горелки газопламенные	150401	маш.-ч	0,972	20,79	20,21
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	4,86	1 045,31	5 080,21
		Спецавтомашины типа УАЗ	400302	маш.-ч	4,86	1 359,28	6 606,10
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	9,396	36,50	342,95
		Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм	101-2782	м	567	7,02	3 980,34
		Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	4,05	1 712,07	6 933,88
		Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	1620	177,63	287 760,60
		Затвердитель аминный модифицированный Тугрегip LT B (компонент B эпоксидной смолы)	113-0420	кг	162	1 186,60	192 229,20
		Смола эпоксидная марки Тугрегip LT A модифицированная (компонент A эпоксидной смолы)	113-0456	кг	162	1 542,28	249 849,36
		Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	129,6	456,40	59 149,44
2	42	Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	-4,05	1 712,07	-6 933,88 ✓

1	2	3	4	5	6	7	8
3	43	Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	-1620	177,63	- 287 760,60 ✓
4	44	Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент B эпоксидной смолы)	113-0420	кг	-162	1 186,60	- 192 229,20 ✓
5	45	Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент A эпоксидной смолы)	113-0456	кг	-162	1 542,28	- 249 849,36 ✓
6	46	Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	-129,6	456,40	-59 149,44 ✓
7	47	Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101>; расход 0,3 кг/1 м2	101-5870	кг	48,6	263,82	12 821,65 ✓
8	48	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	01.6.03.02-0003	м2	162	1 670,13	270 561,06 ✓
Итоги по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	19,44		4 564,90
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,62		433,74
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	21,06		4 998,64
		Стоимость эксплуатации машин					12 638,76
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					800 245,77
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 512 539,77
		Стоимость материалов					287 706,00
		Итого прямые затраты по разделу					304 909,66
		Накладные расходы					6 398,26
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 4998,64	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				6 398,26
		Сметная прибыль					4 048,90
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 4998,64	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				4 048,90
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					315 356,82
Итоги по акту							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	19,44		4 564,90
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,62		433,74
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	21,06		4 998,64
		Стоимость эксплуатации машин					12 638,76
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					800 245,77
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 512 539,77
		Стоимость материалов					287 706,00
		Итого прямые затраты по акту					304 909,66
		Накладные расходы					6 398,26
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 4998,64	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				6 398,26
		Сметная прибыль					4 048,90
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 4998,64	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				4 048,90
		Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью					315 356,82

1	2	3	4	5	6	7	8
	Налоги						
	НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ						63 071,36
	Итого						378 428,18
	ВСЕГО ПО АКТУ						378 428,18

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской
области

Примечание:



И.В.Шкалей

И.В.Солдатов

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код
			О322005
Заказчик (генподрядчик)	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д.110Е, каб.207 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	04247312
Стройка	Благоустройство дворовой территории (наименование, адрес)		
Объект	Дворовая территория по адресу: п.Смышляевка, ул. Октябрьская, 26 (наименование)		
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	1МК-УГ/2019
		дата	25.04.2019
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-39	27/08/2019	09/08/2019	27/08/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

233 597,63 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Детская площадка					
1	41	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (прим.-Устройство покрытия цветного для детских площадок "Мастерфайбр" толщ. 10 мм)	27-09-022-01	1 м2 покрытия	100	5 045,99	504 598,41 ✓
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	12	234,82	2 817,84
		Рабочий строитель среднего разряда 4	1-1040				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1	267,74	267,74
		Электростанции передвижные 2 кВт	040101	маш.-ч	0,6	360,84	216,50
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	0,4	897,37	358,95
		Горелки газопламенные	150401	маш.-ч	0,6	20,79	12,47
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	3	1 045,31	3 135,93
		Спецавтомашины типа УАЗ	400302	маш.-ч	3	1 359,28	4 077,84
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	5,8	36,50	211,70
		Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм	101-2782	м	350	7,02	2 457,00
		Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	2,5	1 712,07	4 280,18
		Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	1000	177,63	177 630,00
		Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент B эпоксидной смолы)	113-0420	кг	100	1 186,60	118 660,00
		Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент A эпоксидной смолы)	113-0456	кг	100	1 542,28	154 228,00
		Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	80	456,40	36 512,00
2	42	Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	-2,5	1 712,07	-4 280,18 ✓
3	43	Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	-1000	177,63	-177 630,00 ✓


1	2	3	4	5	6	7	8
4	44	Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	113-0420	кг	-100	1 186,60	- 118 660,00 ✓
5	45	Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	113-0456	кг	-100	1 542,28	- 154 228,00 ✓
6	46	Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	-80	456,40	-36 512,00 ✓
7	47	Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101>; расход 0,3 кг/1 м2	101-5870	кг	30	263,82	7 914,60 ✓
8	48	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	01.6.03.02-0003	м2	100	1 670,13	167 013,00 ✓
Итоги по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	12		2 817,84
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1		267,74
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	13		3 085,58
		Стоимость эксплуатации машин					7 801,69
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					493 978,88
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 316 382,58
		Стоимость материалов					177 596,30
		Итого прямые затраты по разделу					188 215,83
		Накладные расходы					3 949,54
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 3085,58	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				3 949,54
		Сметная прибыль					2 499,32
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 3085,58	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				2 499,32
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					194 664,69
Итоги по акту							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	12		2 817,84
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1		267,74
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	13		3 085,58
		Стоимость эксплуатации машин					7 801,69
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					493 978,88
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 316 382,58
		Стоимость материалов					177 596,30
		Итого прямые затраты по акту					188 215,83
		Накладные расходы					3 949,54
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 3085,58	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				3 949,54
		Сметная прибыль					2 499,32
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 3085,58	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				2 499,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью					194 664,69
		Налоги					
		НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ					38 932,94
		Итого					233 597,63
		ВСЕГО ПО АКТУ					233 597,63

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Примечание:

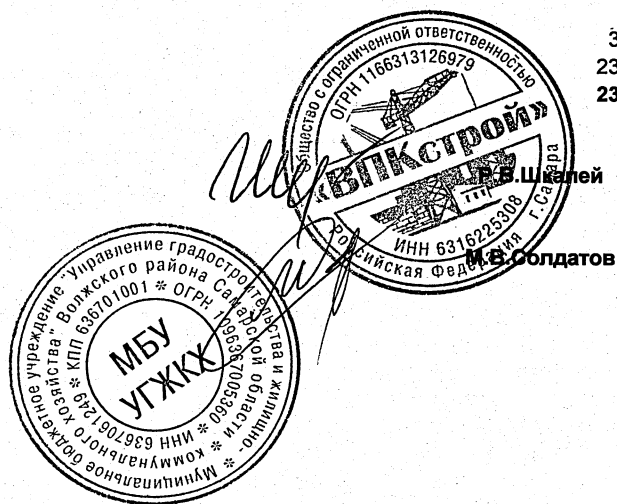

Инвестор (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код	0322005	
Заказчик МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627		
Подрядчик ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д. 110Е, каб. 207 (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	04247312		
Стройка Благоустройство дворовой территории (наименование, адрес)				
Объект Дворовая территория по адресу: п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 6, 6а (наименование)				
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	1МК-УГ/2019	
		дата	25.04.2019	
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-40	27/08/2019	09/08/2019	27/08/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

537 274,55 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по- рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Детская площадка							
1	47	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (прим.-Устройство покрытия цветного для детских площадок "Мастерфайбр" толщ. 10 мм)	27-09-022-01	1 м2 покрытия	230	5 045,99	1 160 576,34
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	27,6	234,82	6 481,03
		Рабочий строитель среднего разряда 4	1-1040				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,3	267,74	615,80
		Электростанции передвижные 2 кВт	040101	маш.-ч	1,38	360,84	497,96
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	0,92	897,37	825,58
		Горелки газопламенные	150401	маш.-ч	1,38	20,79	28,69
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	6,9	1 045,31	7 212,64
		Спецавтомашины типа УАЗ	400302	маш.-ч	6,9	1 359,28	9 379,03
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	13,34	36,50	486,91
		Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм	101-2782	м	805	7,02	5 651,10
		Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	5,75	1 712,07	9 844,40
		Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	2300	177,63	408 549,00
		Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	113-0420	кг	230	1 186,60	272 918,00
		Смола эпоксидная марки Turegrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	113-0456	кг	230	1 542,28	354 724,40
		Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	184	456,40	83 977,60
2	48	Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	-5,75	1 712,07	-9 844,40

1	2	3	4	5	6	7	8
3	49	Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	-2300	177,63	- 408 549,00 ✓
4	50	Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	113-0420	кг	-230	1 186,60	- 272 918,00 ✓
5	51	Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	113-0456	кг	-230	1 542,28	- 354 724,40 ✓
6	52	Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	-184	456,40	-83 977,60 ✓
7	53	Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101>; расход 0,3 кг/1 м2	101-5870	кг	69	263,82	18 203,58 ✓
8	54	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	01.6.03.02-0003	м2	230	1 670,13	384 129,90 ✓
Итоги по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	27,6		6 481,03
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	2,3		615,80
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	29,9		7 096,83
		Стоимость эксплуатации машин					17 943,90
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					1 136 151,41
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 727 679,92
		Стоимость материалов					408 471,49
		Итого прямые затраты по разделу					432 896,42
		Накладные расходы					9 083,94
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 7096,83	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				9 083,94
		Сметная прибыль					5 748,43
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 7096,83	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				5 748,43
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					447 728,79
Итоги по акту							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	27,6		6 481,03
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	2,3		615,80
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	29,9		7 096,83
		Стоимость эксплуатации машин					17 943,90
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					1 136 151,41
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 727 679,92
		Стоимость материалов					408 471,49
		Итого прямые затраты по акту					432 896,42
		Накладные расходы					9 083,94
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 7096,83	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				9 083,94
		Сметная прибыль					5 748,43
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 7096,83	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				5 748,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью					447 728,79

Налоги

НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ

Итого

ВСЕГО ПО АКТУ

89 545,76

537 274,55

537 274,55

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской
области

Примечание:



Инвестор		Форма по ОКУД по ОКПО	Код	
(организация, адрес, телефон, факс)			0322005	
Заказчик	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области,		по ОКПО	60264627
(генподрядчик)	443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 (организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик	ООО "ВПКСтрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д. 110Е, каб. 207		по ОКПО	04247312
(субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	Благоустройство дворовой территории			
(наименование, адрес)				
Объект	Дворовая территория по адресу: п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 8			
(наименование)				
Вид деятельности по ОКДП		номер	1МК-УГ/2019	
Договор подряда (контракт)		дата	25.04.2019	
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-41	27/08/2019	09/08/2019	27/08/2019

АКТ**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

420 475,73 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуара, дорожек					
		Итоги по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Детская площадка					
1	40	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (прим.-Устройство покрытия цветного для детских площадок "Мастерфайбр" толщ. 10 мм)	27-09-022-01	1 м2 покрытия	180	5 045,99	908 277,14 ✓
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	21,6	234,82	5 072,11
		Рабочий строитель среднего разряда 4	1-1040				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,8	267,74	481,93
		Электростанции передвижные 2 кВт	040101	маш.-ч	1,08	360,84	389,71
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	0,72	897,37	646,11
		Горелки газопламенные	150401	маш.-ч	1,08	20,79	22,45
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	5,4	1 045,31	5 644,67
		Спецавтомшины типа УАЗ	400302	маш.-ч	5,4	1 359,28	7 340,11
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	10,44	36,50	381,06
		Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм	101-2782	м	630	7,02	4 422,60
		Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	4,5	1 712,07	7 704,32
		Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	1800	177,63	319 734,00
		Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	113-0420	кг	180	1 186,60	213 588,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	113-0456	кг	180	1 542,28	277 610,40
		Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	144	456,40	65 721,60
2	41	Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	-4,5	1 712,07	-7 704,32 ✓
3	42	Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	-1800	177,63	- 319 734,00 ✓
4	43	Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	113-0420	кг	-180	1 186,60	- 213 588,00 ✓
5	44	Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	113-0456	кг	-180	1 542,28	- 277 610,40 ✓
6	45	Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	-144	456,40	-65 721,60 ✓
7	46	Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101>; расход 0,3 кг/1 м2	101-5870	кг	54	263,82	14 246,28 ✓
8	47	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	01.6.03.02-0003	м2	180	1 670,13	300 623,40 ✓
Итоги по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	21,6		5 072,11
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,8		481,93
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	23,4		5 554,04
		Стоимость эксплуатации машин					14 043,05
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					889 161,98
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 569 488,64
		Стоимость материалов					319 673,34
		Итого прямые затраты по разделу					338 788,50
		Накладные расходы					7 109,17
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 5554,04	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				7 109,17
		Сметная прибыль					4 498,77
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 5554,04	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				4 498,77
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					350 396,44
Итоги по акту							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	21,6		5 072,11
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,8		481,93
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	23,4		5 554,04
		Стоимость эксплуатации машин					14 043,05
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					889 161,98
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 569 488,64
		Стоимость материалов					319 673,34
		Итого прямые затраты по акту					338 788,50
		Накладные расходы					7 109,17
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 5554,04	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				7 109,17
		Сметная прибыль					4 498,77
		в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 5554,04	Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				4 498,77

Итого по акту с накладными расходами и
сметной прибылью

350 396,44

Налоги

НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ

70 079,29

Итого

420 475,73

ВСЕГО ПО АКТУ

420 475,73

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской
области

Примечание:



Инвестор		Форма по ОКУД по ОКПО	Код	
(организация, адрес, телефон, факс)			0322005	
Заказчик	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627	
Подрядчик	ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д.110Е, каб.207 (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	04247312
Стройка	Благоустройство дворовой территории (наименование, адрес)			
Объект	Дворовая территория по адресу: п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д.9,11,13 (наименование)			
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	1МК-УГ/2019	
		дата	25.04.2019	
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-42	27/08/2019	09/08/2019	27/08/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

478 875,16 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуара					
		Итоги по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Детская площадка					
1	41	Устройство цветного противоскользкого дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (прим.-Устройство покрытия цветного для детских площадок "Мастерфайбр" толщ. 10 мм)	27-09-022-01	1 м2 покрытия	205	5 045,99	1 034 426,74 ✓
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	24,6	234,82	5 776,57
		Рабочий строитель среднего разряда 4	1-1040				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,05	267,74	548,87
		Электростанции передвижные 2 кВт	040101	маш.-ч	1,23	360,84	443,83
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	0,82	897,37	735,84
		Горелки газопламенные	150401	маш.-ч	1,23	20,79	25,57
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	6,15	1 045,31	6 428,66
		Спецавтомашины типа УАЗ	400302	маш.-ч	6,15	1 359,28	8 359,57
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	11,89	36,50	433,99
		Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм	101-2782	м	717,5	7,02	5 036,85
		Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	5,125	1 712,07	8 774,36
		Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	2050	177,63	364 141,50
		Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент B эпоксидной смолы)	113-0420	кг	205	1 186,60	243 253,00
		Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент A эпоксидной смолы)	113-0456	кг	205	1 542,28	316 167,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Праймер СР PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	164	456,40	74 849,60
2	42	Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	-5,125	1 712,07	-8 774,36 ✓
3	43	Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	-2050	177,63	- 364 141,50 ✓
4	44	Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	113-0420	кг	-205	1 186,60	- 243 253,00 ✓
5	45	Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	113-0456	кг	-205	1 542,28	- 316 167,40 ✓
6	46	Праймер СР PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	-164	456,40	-74 849,60 ✓
7	47	Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101>; расход 0,3 кг/1 м2	101-5870	кг	61,5	263,82	16 224,93 ✓
8	48	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	01.6.03.02-0003	м2	205	1 670,13	342 376,65 ✓
Итоги по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	24,6		5 776,57
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	2,05		548,87
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	26,65		6 325,44
		Стоимость эксплуатации машин					15 993,47
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					1 012 656,70
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 648 584,28
		Стоимость материалов					364 072,42
		Итого прямые затраты по разделу					385 842,46
		Накладные расходы					8 096,56
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 6325,44	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				8 096,56
		Сметная прибыль					5 123,61
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 6325,44	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				5 123,61
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					399 062,63
Ограждение							
Итоги по разделу							
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Итоги по акту					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	24,6		5 776,57
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	2,05		548,87
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	26,65		6 325,44
		Стоимость эксплуатации машин					15 993,47
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					1 012 656,70
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 648 584,28
		Стоимость материалов					364 072,42
		Итого прямые затраты по акту					385 842,46
		Накладные расходы					8 096,56
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 6325,44	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				8 096,56
		Сметная прибыль					5 123,61
		в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 6325,44		Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				5 123,61

Итого по акту с накладными расходами и
сметной прибылью

399 062,63

Налоги

НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ

79 812,53

Итого

478 875,16

ВСЕГО ПО АКТУ

478 875,16

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской
области

Примечание:



Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код	
			О322005	
Заказчик (генподрядчик)	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627	
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ВПКСтрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д. 110Е, каб. 207 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	04247312	
Стройка	Благоустройство дворовой территории (наименование, адрес)			
Объект	Дворовая территория по адресу: п. Черновский, пер. Коммунальный, д. 8, ул. Школьная, д. 13 (наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	1МК-УГ/2019	
		дата	25.04.2019	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-43	27/08/2019	09/08/2019	27/08/2019

АКТ**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

291 997,06 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуара					
		Итоги по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Детская площадка					
1	41	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (прим.-Устройство покрытия цветного для детских площадок "Мастерфайбр" толщ. 10 мм)	27-09-022-01	1 м2 покрытия	125	5 045,99	630 748,02
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	15	234,82	3 522,30
		Рабочий строитель среднего разряда 4	1-1040				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,25	267,74	334,68
		Электростанции передвижные 2 кВт	040101	маш.-ч	0,75	360,84	270,63
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	0,5	897,37	448,69
		Горелки газопламенные	150401	маш.-ч	0,75	20,79	15,59
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	3,75	1 045,31	3 919,91
		Спецавтомашины типа УАЗ	400302	маш.-ч	3,75	1 359,28	5 097,30
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	7,25	36,50	264,63
		Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм	101-2782	м	437,5	7,02	3 071,25
		Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	3,125	1 712,07	5 350,22
		Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	1250	177,63	222 037,50
		Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	113-0420	кг	125	1 186,60	148 325,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Смола эпоксидная марки Turegrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	113-0456	кг	125	1 542,28	192 785,00
		Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	100	456,40	45 640,00
2	42	Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT>	101-2783	кг	-3,125	1 712,07	-5 350,22 ✓
3	43	Крошка бокситная 1-3 мм	101-2784	кг	-1250	177,63	- 222 037,50 ✓
4	44	Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	113-0420	кг	-125	1 186,60	- 148 325,00 ✓
5	45	Смола эпоксидная марки Turegrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	113-0456	кг	-125	1 542,28	- 192 785,00 ✓
6	46	Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	113-2224	кг	-100	456,40	-45 640,00 ✓
7	47	Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101>; расход 0,3 кг/1 м2	101-5870	кг	37,5	263,82	9 893,25 ✓
8	48	Покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	01.6.03.02-0003	м2	125	1 670,13	208 766,25 ✓
Итоги по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	15		3 522,30
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,25		334,68
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	16,25		3 856,98
		Стоимость эксплуатации машин					9 752,12
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					617 473,60
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 395 478,22
		Стоимость материалов					221 995,38
		Итого прямые затраты по разделу					235 269,80
		Накладные расходы					4 936,93
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 3856,98	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				4 936,93
		Сметная прибыль					3 124,15
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 3856,98	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				3 124,15
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					243 330,88
		Ограждение детской площадки и палисадника					
Итоги по разделу							
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Итого по акту					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	15		3 522,30
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,25		334,68
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	16,25		3 856,98
		Стоимость эксплуатации машин					9 752,12
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					617 473,60
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 395 478,22
		Стоимость материалов					221 995,38
		Итого прямые затраты по акту					235 269,80
		Накладные расходы					4 936,93
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 3856,98	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				4 936,93
		Сметная прибыль					3 124,15

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 81% от ФОТ		Письмо АП-				
	текущего 3856,98		5536/06 прил.1				3 124,15
			п.21, прим.п.1				

**Итого по акту с накладными расходами и
сметной прибылью**

243 330,88

Налоги

НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ

48 666,18

Итого

291 997,06

ВСЕГО ПО АКТУ

291 997,06

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

**Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской
области**

